



พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” จังหวัดตราด



ดำเนินการในพื้นที่ 6 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 14 แปลง

งบประมาณ 1,220,800 บาท ประกอบด้วย

พื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 4 แปลง ๆ ละ 45,200 บาท เป็นเงิน 180,800 บาท
พื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 10 แปลง ๆ ละ 104,000 บาท เป็นเงิน 1,040,000 บาท

อำเภอคลองใหญ่ 1 ราย

- นายไพศาล เจริญศรี บ้านคลองมะนาว ม.4 ต.ไม้รุุด

1 ไร่

อำเภอเกาะช้าง 1 ราย

- นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ ม.5 ต.เกาะช้างใต้

3 ไร่

อำเภอบ่อไร่ 1 ราย

- นายบุญสม อ่องปรานนท์ บ้านตากแว้งกลาง ม.4 ต.บ่อพลอย

3 ไร่

อำเภอเขาสมิง 4 ราย

- นางวิสา ปาจันทร์ บ้านตกลมรงค์ ม.6 ต.ประณีต
- นางเอกอนันต์ บุญมี บ้านใหม่สามัคคี ม.7 ต.ทุ่งนทรีย์
- น.ส. สุดใจ เดชตระกูล บ้านเจียรพัฒนา ม.4 ต.เทพนิมิต
- นายสุรจิตร์ แก้วนาง บ้านป่าโรน ม.4 ต.เขาสมิง

3 ไร่

1 ไร่

1 ไร่

3 ไร่

อำเภอแหลมงอบ 1 ราย

- นายรุ่งเรือง บุญเชษฐ์ บ้านแหลมอวน ม.4 ต.คลองใหญ่

3 ไร่

อำเภอเมืองตราด 6 ราย

- นางวิรัตน์ กวางใส บ้านท่าประดู่ ม.7 ต.วังกระแจะ
- นายพรชัย รานะ บ้านท่าตะเภา ม.2 ต.หนองเสม็ด
- นางพิสมัย อินทเกษตร บ้านหนองคันทรง ม.3 ต.หนองคันทรง
- นางสุภา มณีเพชร บ้านทุ่งบางเพชร ม.4 ต.ตะกวาง
- นางรัชนิศ ศิริรักษ์ บ้านหนองเสม็ด ม.3 ต.หนองเสม็ด
- ร.ท.มณฑล อุดมโชค ร.น. บ้านหนองปรือ ม.5 ต.ท่ากุ่ม

3 ไร่

3 ไร่

3 ไร่

3 ไร่

3 ไร่

1 ไร่



จำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 6 อำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 14 หมู่บ้าน/แปลง

ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 4 หมู่บ้าน/แปลง

ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 10 หมู่บ้าน/แปลง





ก้าวต่อไป...โคกหนองนา_ตราด

โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

- 1) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 6 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอเกาะกูด) รวมทั้งสิ้น 34 คน เสร็จสิ้นแล้ว (22 - 26 พ.ย. 64)
- 2) กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการอบรมสัมมนาฯ ในหมู่บ้านครบทั้ง 14 หมู่บ้านแล้วในไตรมาส 1 (ธ.ค. 64)
- 3) กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านหนองเสม็ด ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองฯ/บ้านตากแว้งกลาง ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ และบ้านแหลมอวน ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ) ที่เหลือ 11 หมู่บ้าน รอการจัดสรรงบประมาณฯ ในการดำเนินงานตามไตรมาสต่อไป
- 4) กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนา” ดำเนินการทำสัญญาและ PO ครบทั้ง 14 หมู่บ้านแล้ว (13 หมู่บ้านในเดือน ธ.ค. 64 และ 1 หมู่บ้าน เปลี่ยนแปลงพื้นที่และเลขรหัส งบประมาณฯ ในเดือน ก.พ.65) ผลการดำเนินงาน ดังนี้




- ขุดเสร็จสิ้นแล้ว 11 แปลง
- อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อปรับพื้นที่ 1 แปลง
- ผู้รับจ้างลงตรวจพื้นที่เตรียมปรับขุดแปลง 2 แปลง (ยังไม่ขุด)
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 8 แปลง และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 แปลง รวมเป็นเงิน 214,733.57 บาท

- 5) กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลและถอดบทเรียน อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามไตรมาส



งบประมาณ 1,220,800 บาท

ผลการดำเนินงาน




■ ขุดแล้ว ■ ยังไม่ขุด ■ อยู่ระหว่างขุด




โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565



ที่	อำเภอ	ได้รับจัดสรร (แปลง)			ความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรมที่ 4 (ชุดปรับพื้นที่)												
					1 ไร่			3 ไร่			รวม						
		1 ไร่	3 ไร่	รวม	ยังไม่ขุด	อยู่ระหว่างขุด	ขุดแล้ว	ยังไม่ขุด	อยู่ระหว่างขุด	ขุดแล้ว	ยังไม่ขุด	อยู่ระหว่างขุด	ขุดแล้ว	ขุดแล้ว ร้อยละ	เบิกจ่ายแล้ว (แปลง)	เบิกจ่าย ร้อยละ	
1	เมืองตราด	1	5	6	0	0	1	1	0	4	1	0	5	83	1	17	
2	เกาะช้าง	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
3	เขาสมิง	2	2	4	0	0	2	0	1	1	0	1	3	75	0	0	
4	คลองใหญ่	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	1	100	
5	บ่อไร่	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	
6	แหลมงอบ	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	1	100	
รวม		4	10	14	0	0	4	2	1	7	2	1	11	79	3	36	

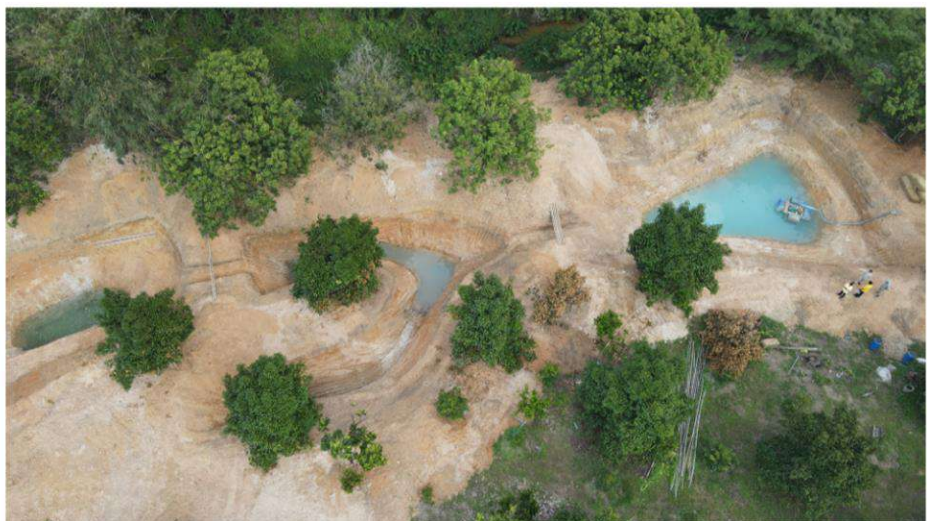

ผลการดำเนินงาน

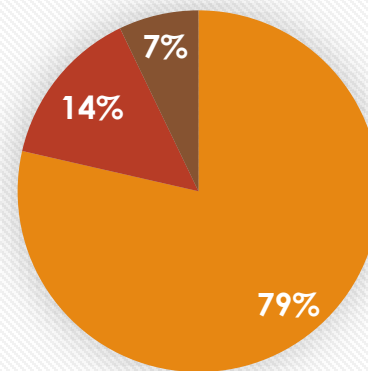

■ ขุดแล้ว ■ ยังไม่ขุด ■ อยู่ระหว่างขุด

เป้าหมาย 14 แปลง
เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 3 แปลง
เป็นจำนวนเงิน 214,733.57 บาท
คิดเป็นร้อยละ 36
(งบประมาณจัดสรรรวม 1,220,800 บาท)



โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2565 (เวลา 15.30 น.)

ที่	ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด พื้นที่ (ไร่)	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การทำสัญญา					การใช้จ่ายงบประมาณ				หมายเหตุ	
						วันที่ทำ สัญญา	เลข PO	วันครบ กำหนด	แบบแปลน	จำนวน (ลบ.ม.)	ผู้รับจ้าง	งบประมาณ จัดสรร	งบฯ ตาม สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ
1	นางรัชนิศ ศิริรักษ์	3	3	หนองเสม็ด	เมืองตราด	8 ธ.ค.64	7017197038	7 ก.พ.65	แบบ catalog ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:1 ดินร่วนปนทราย	3,155	นายอาวุธ งามศรี	104,000.00	104,000.00	82,361.44	21,638.56	ขาด/เบิก แล้ว
2	นายวิรัตน์ กวางใส	3	7	วังกระแจะ	เมืองตราด	24-ธ.ค.-64	7017286716	26 มี.ค.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 2:3 สำหรับดินร่วนปนทราย	4,000	นายสราวดี บุตรทอง	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	ขาดเสร็จแล้ว
3	นายพรชัย ฐานะ	3	2	หนองเสม็ด	เมืองตราด	24-ธ.ค.-64	7017284022	26 มี.ค.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 2:3 สำหรับดินเหนียว	4,000	นายชัชวาล แนวพนา	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	กำลังขาด
4	นางพิศมัย อินทเกษร	3	3	หนองคันทรัง	เมืองตราด	24-ธ.ค.-64	7017292116	26 มี.ค.65	แบบพื้นที่ 3 ไร่ สำหรับดินร่วนปนทราย	4,000	นายชัชวาล แนวพนา	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	ขาดเสร็จแล้ว
5	นางสุภา มณีเพชร	3	4	ตะกาง	เมืองตราด	27-ธ.ค.-64	7017291611	27 มี.ค.65	แบบพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 2:3 สำหรับดินเหนียว	4,000	นางสาวนิชาภา ทานะมัย	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	ขาดเสร็จแล้ว
6	ร.ท.มณฑล อุดมโชค ร.น.	1	5	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	27-ธ.ค.-64	7017287658	27 มี.ค.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 2:3 สำหรับดินเหนียว	1,500	นางสาวนิชาภา ทานะมัย	45,200.00	45,200.00	-	45,200.00	ขาดเสร็จแล้ว
7	นางสาวสุดใจ เดชตระกูล	1	4	เทพนิมิต	เขาสมิง	24-ธ.ค.-64	7017278791	22 ก.พ.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย	1,500	นายอาวุธ งามศรี	45,200.00	45,200.00	-	45,200.00	ขาดเสร็จแล้ว
8	นางสุรจิตร์ แก้วนาง	3	4	เขาสมิง	เขาสมิง	24-ธ.ค.-64	7017274369	24 มี.ค.65	แบบ Catalog บ่อน้ำ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย	4,000	นายอาวุธ งามศรี	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	ขาดเสร็จแล้ว
9	นายเอกอนันต์ บุญมี	1	7	ทุ่งนนทรี	เขาสมิง	24-ธ.ค.-64	7017278758	22 ก.พ.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย	1,500	นายอาวุธ งามศรี	45,200.00	45,200.00	-	45,200.00	ขาดเสร็จแล้ว
10	นางวิสา ปาจันทร์	3	6	ประณีต	เขาสมิง	24-ธ.ค.-64	7017274372	24 มี.ค.65	แบบ Catalog บ่อน้ำ สัดส่วน 1:1 ดินทราย	4,000	นายอาวุธ งามศรี	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	กำลังขาด
11	นายบุญสม อ่องลาปวารานนท์	3	4	บ่อพลอย	บ่อไร่	23-ธ.ค.-64	7017265228	21 ก.พ.65	แบบพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1 ดินร่วนปนทราย ไม้ลดขนาด	3,874	นายอาวุธ งามศรี	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	ขาดเสร็จแล้ว
12	นายรุ่งเรือง บุญเชษฐ์	3	4	คลองใหญ่	แหลมงอบ	9-ธ.ค.-64	7016998082	7 ก.พ.65	แบบพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1 สำหรับดินร่วนปนทราย	4,000	นายอาวุธ งามศรี	104,000.00	104,000.00	104,000.00	-	ขาด/เบิก แล้ว
13	นายไพศาล เจริญศรี	1	4	ไม้รูด	คลองใหญ่	13-ธ.ค.-64	7017221162	11 ก.พ.65	แบบงานขุดดินพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1 ดินร่วนปนทราย	1,500	นายอาวุธ งามศรี	45,200.00	45,200.00	28,372.13	16,827.87	ขาด/เบิก แล้ว
14	นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร	3	5	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	21-ก.พ.-65	7017539472	20 เม.ย.65	แบบมาตรฐานกรมฯ สัดส่วน 1:3 สำหรับดินร่วนปนทราย	4,000	นายศรารัฐ สลักเพชร	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	กำลังขาด
รวมทั้งสิ้น											1,220,800.00	1,220,800.00	214,733.57	1,006,066.43		



ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้รัฐวิสาหกิจใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมระหว่างดำเนินการขุดปรับพื้นที่ 3 แปลงที่เสร็จสิ้นและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว



นางรัชนิศ ศิริรักษ์ ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง



นายรุ่งเรือง บุญเชษฐ์ ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ



นายไพศาล เจริญศรี ม.4 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่

■ บ้านแหลมอวน ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ
พื้นที่แปลงขนาด 3 ไร่ (นายรุ่งเรือง บุญเชษฐ์)

แปลงต้นแบบ Best Practice



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ

- ▶ ขุดปรับพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ตามแบบมาตรฐานกรมฯ จำนวนเงินเบิกจ่าย 104,000 บาท ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ ประมาณ 2,400 ลบ.ม.
- ▶ กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้
 1. การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ (ฐานคนเล่นขี้)
 2. การทำน้ำส้มควันไม้ (ฐานคนเอาถ่าน)
 3. การปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพรและทุเรียน
 4. การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่-เป็ด







